


5 周辺道路整備について

1 周辺道路整備計画

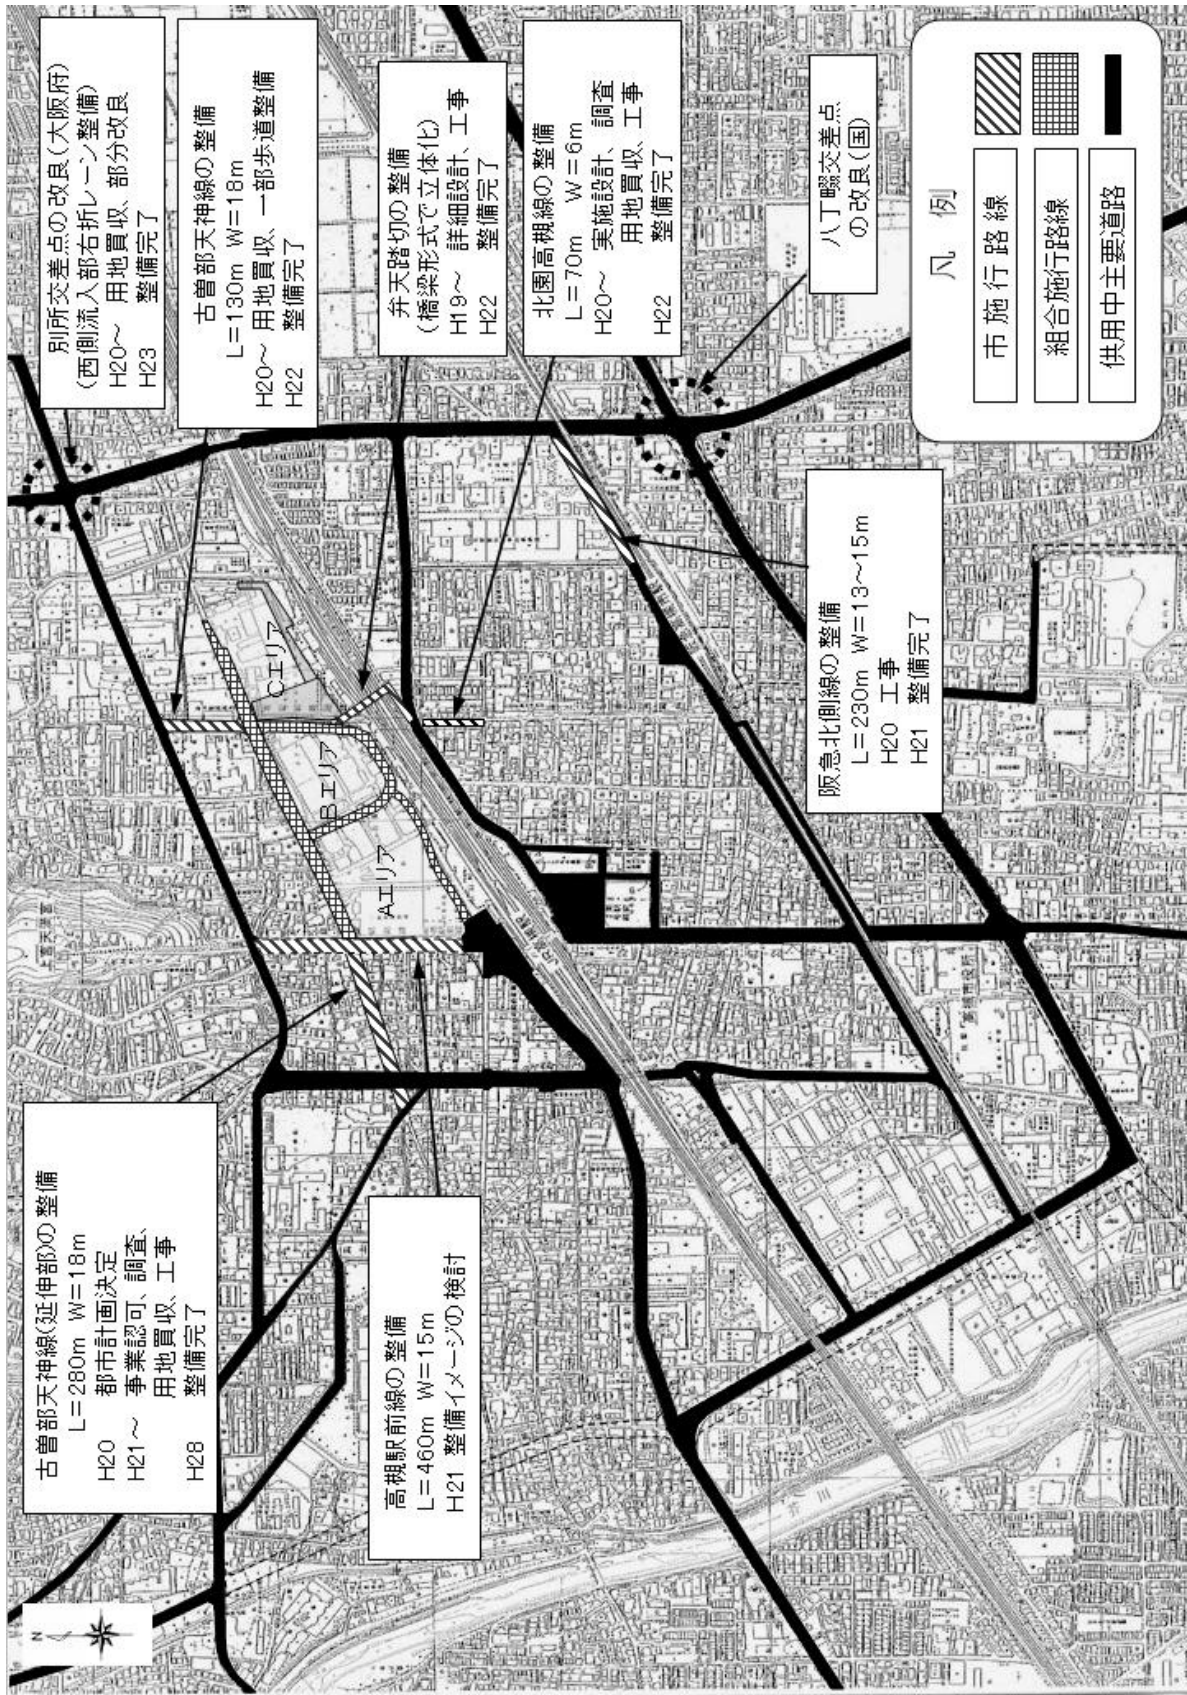

2 弁天踏切等の整備について

(1) 事業目的

踏切遮断時間が長く、開かずの踏切となっている弁天踏切を、歩行者を対象とした橋梁として市が整備するとともに、バリアフリー化を図る。

併せて、組合が北東地区Cエリアに人工デッキや歩道（都市計画道路 古曽部白梅線）を整備し、両者をスムーズに連絡することで、JR高槻駅南北において安全・快適な歩行者ネットワークの形成を図る。

(2) 橋梁全体の整備計画


[構造概要]

	[市施行] 弁天踏切橋梁	[組合施行] 人工デッキ (Cエリア)
橋 長	約 7.2 m	約 5.0 m
種 類	歩行者専用道路 (自転車は降りて通行)	同左
有効幅員	W = 4 m	同左
昇降方式	①エレベーター (車椅子、自転車昇降可能) ②斜路付階段 (自転車昇降スロープの昇りはベルコン方式)	①同左 ②同左 ③歩行者専用階段 (JR駅と連絡する地区内デッキ利用者向けの歩行者専用階段)

[概略工程]


施 行 箇 所	施行者	H21 年度	H22 年度
弁天踏切橋梁	高槻市	▼H21.10 ~ H22.12▼	
人工デッキ (Cエリア)	組 合		~H22.12▼
(都) 古曽部白梅線 (デッキ~西国街道) の東側歩道部	組 合		~H22.12▼

[橋梁等の全体整備計画図]

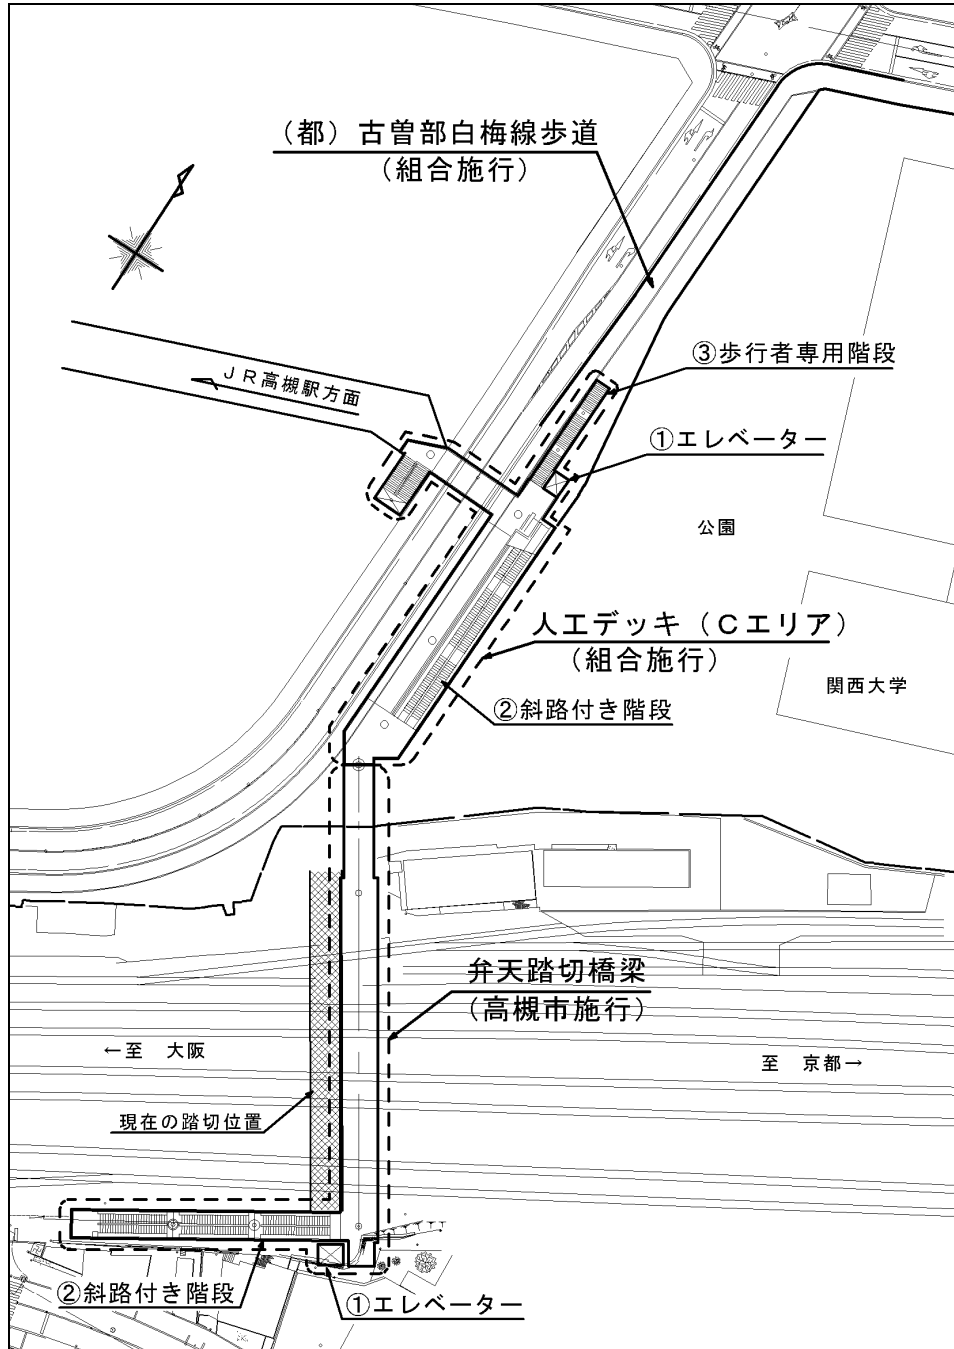

[弁天踏切橋梁の完成イメージ]

<全体図>

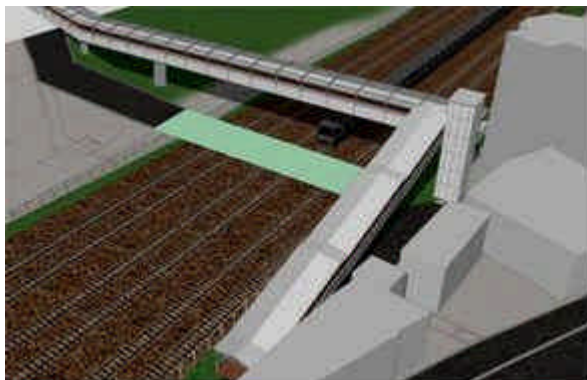

<通路部>



(3) 市工事に伴う弁天踏切の通行止めについて

本市が施行する弁天踏切橋梁化工事において、踏切南側で安全な仮設通路の確保が困難なため通行止めを実施

通行止め期間：平成 21 年 10 月 1 日(木)～平成 22 年 12 月下旬（予定）


通行止めに伴う迂回路

J R 横断ルート：J R 高槻駅の地下道

府道伏見柳谷高槻線の歩道橋

東西方向の主要動線：府道西京高槻線

(西国街道についても安全対策を実施、詳細は次ページ(5)参照)

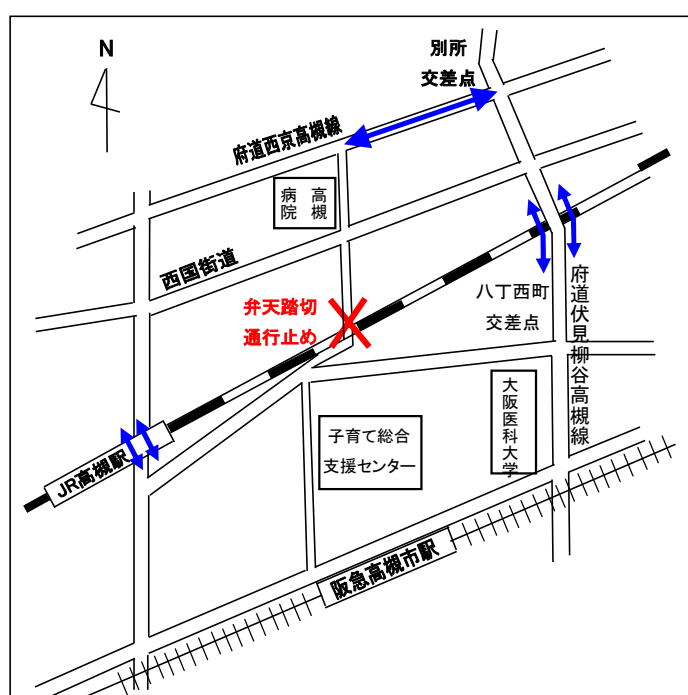


(4) 市工事の周知活動に関する経過と予定

活動内容	場所など	活動時期
工事説明会	総合センター	7月23日(木)、26日(日)
周辺自治会等へのお知らせ文書	周辺自治会・高槻市障害児者団体連絡協議会・病院・老人会・学校等	8月初旬頃～
予告看板の設置	当該踏切および駅周辺	8月初旬頃～
ビラの配布	弁天踏切	8月初旬頃～
広報たかつき	—	7月10日号掲載 8月25日号掲載予定
ホームページ	—	7月10日掲載 8月25日掲載予定

(5) 西国街道等の安全対策

西国街道（都市計画道路 古曾部天神線）等についても、組合及びまちづくり協議会等と協議・調整を行い、以下の安全対策を実施

- ①西国街道（高槻病院前周辺）：まちづくり協議会が、南側に仮歩道(約2m)を早期に整備（平成21年7月末 完成予定）
- ②西国街道（関西大学前周辺）：本市が現道の側溝を改修し、できる限り歩行者等が通行可能なスペースを確保（平成21年9月末 完成予定）
- ㊤高槻病院東側：本市が東側に歩道（4m）を整備（平成21年9月末 完成予定）
- ㊦西国街道（西武百貨店東側～関西大学前周辺）：組合が早期に南側に歩道（4m）を整備（㊦-1：平成22年1月末 完成予定、㊦-2：平成22年3月末 完成予定）
- ㊧西国街道（西武百貨店前周辺）：組合が、西武百貨店北側店舗及び屋上駐車場斜路を解体後、南側に歩道を整備（平成23年3月末 完成予定）

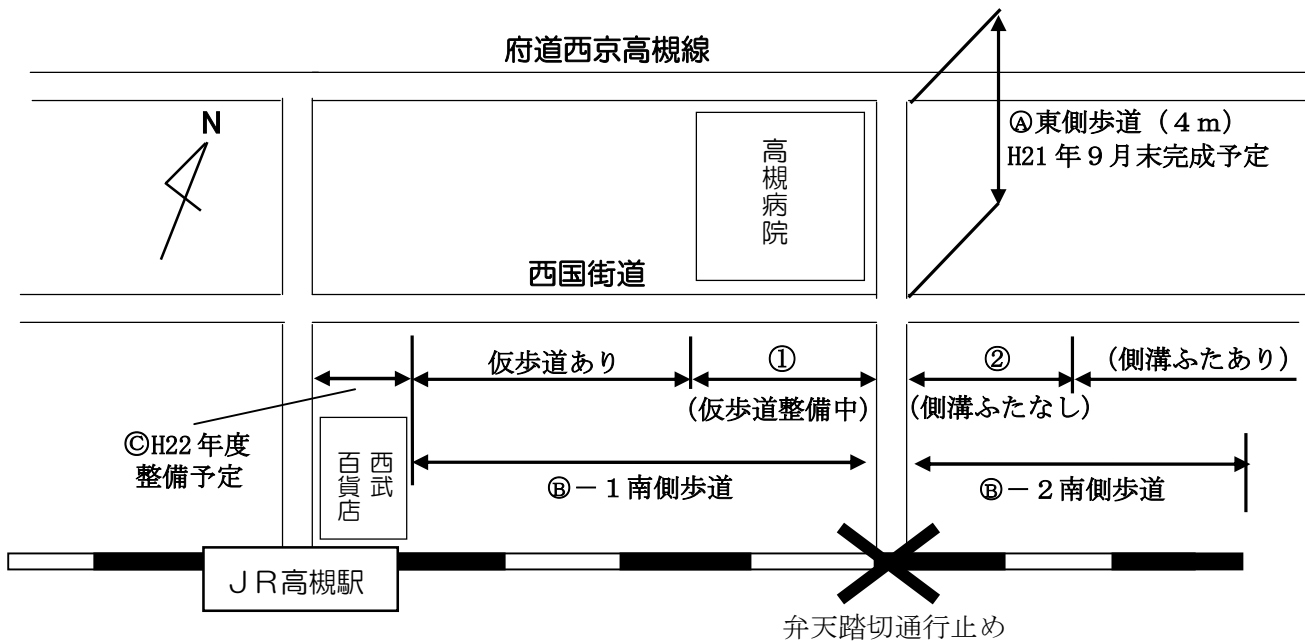

< 弁天踏切通行止め期間中の西国街道南側歩道の状況 >

	平成21年度												平成22年度											
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月					
弁天踏切通行止め																								
西国街道南側歩道の状況																								

弁天踏切通行止め: <1年3ヶ月> (from July 2009 to September 2010)
 西国街道南側歩道の状況:
 仮歩道①②: <4ヶ月> (from July 2009 to October 2009)
 歩道(幅4m): <11ヶ月> (from July 2009 to July 2010)
